
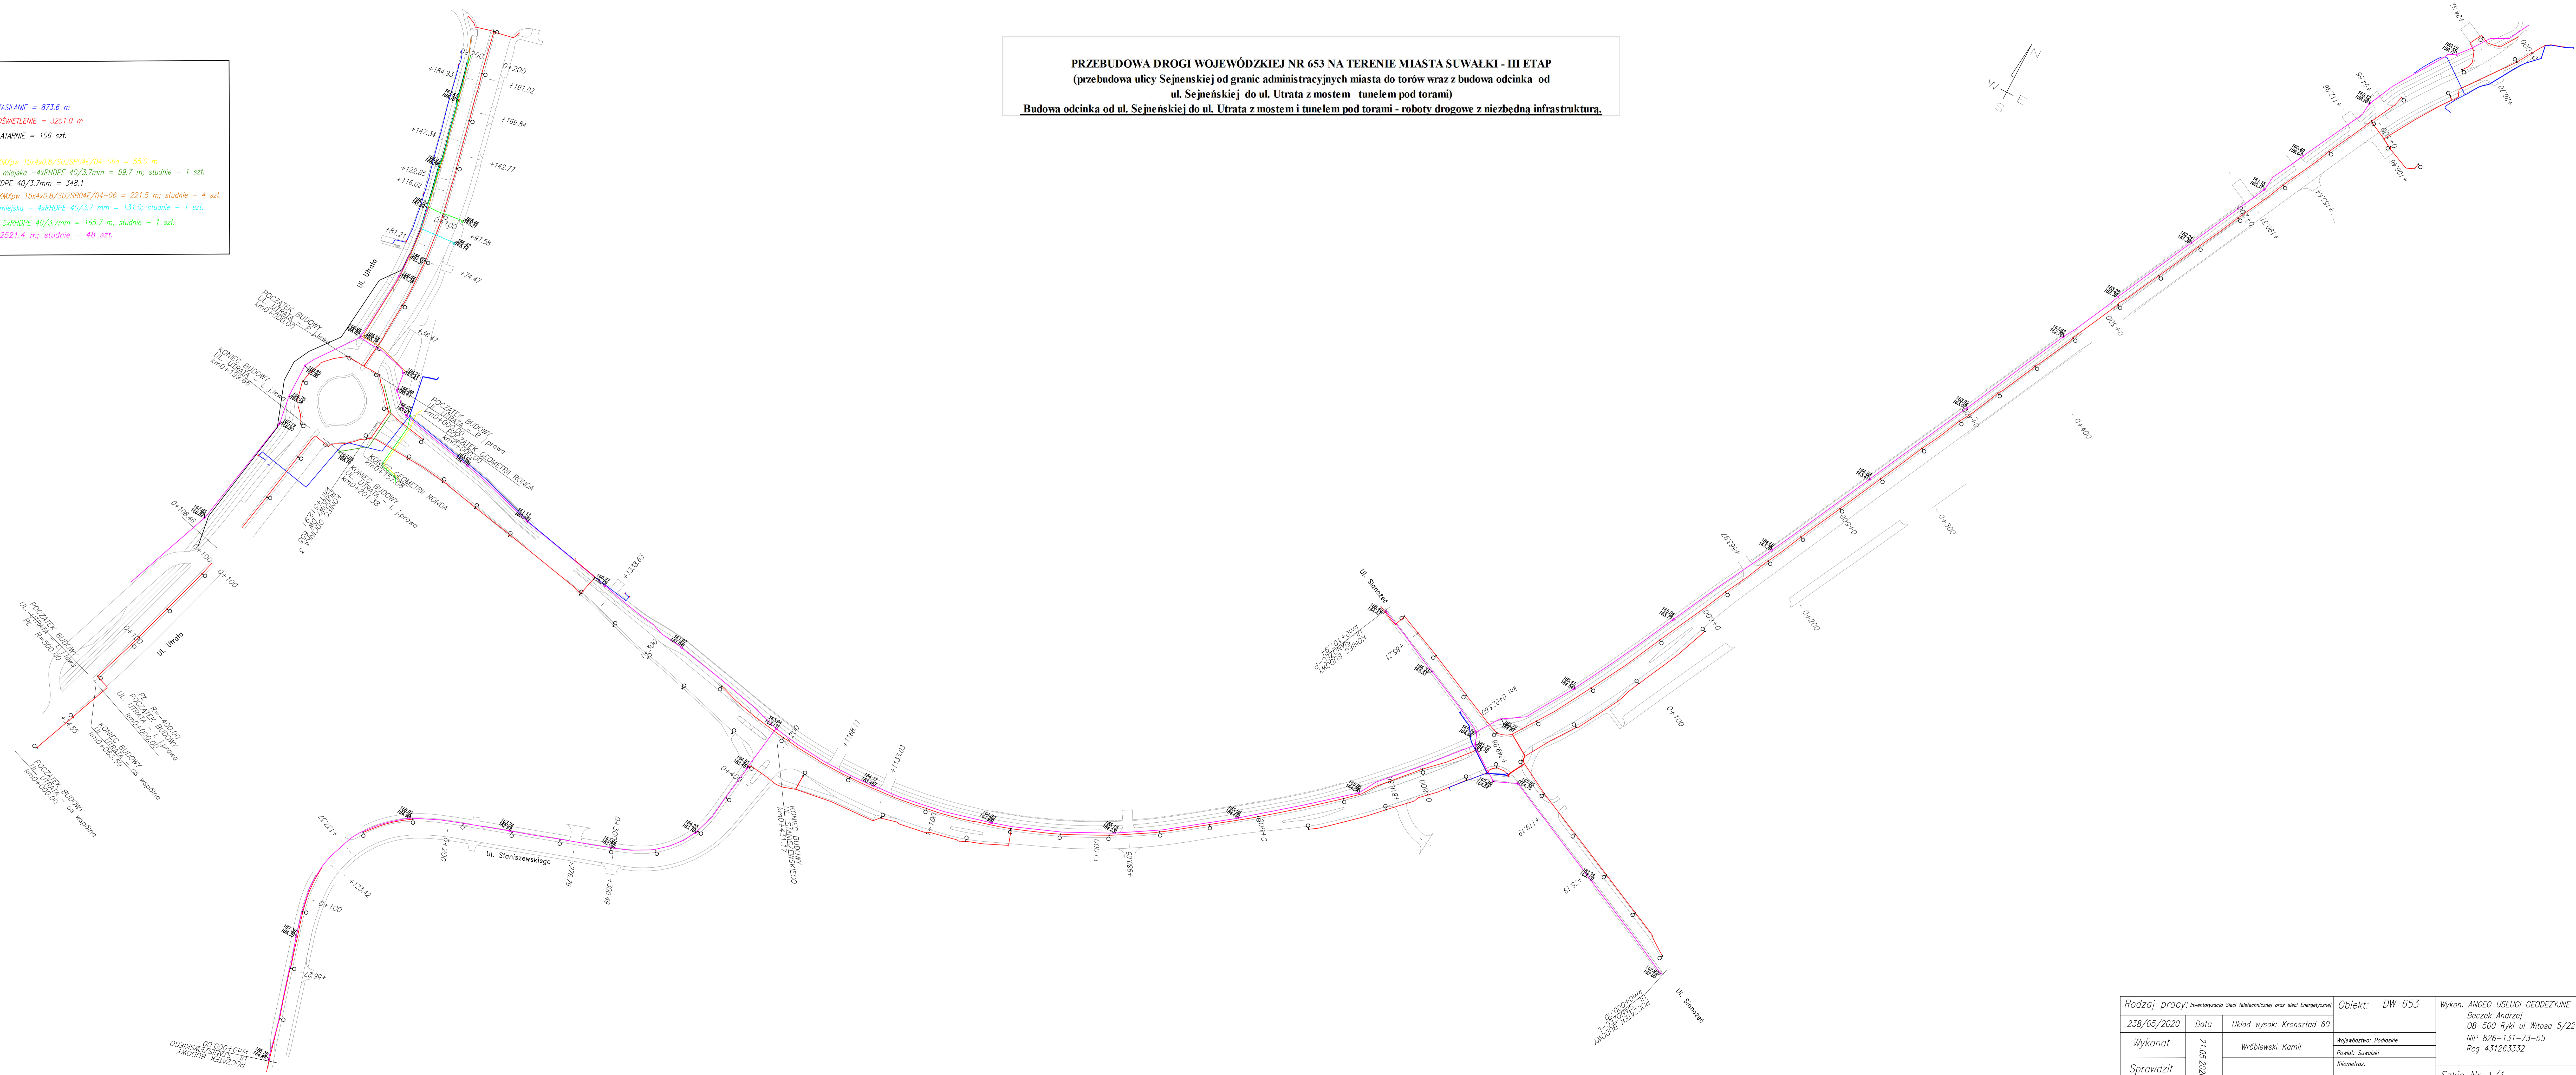


**Zestawienie:**

- SIEĆ ENERGETYCZNA:
- SIEĆ ENERGETYCZNA - ZASILANIE = 873,6 m
- SIEĆ ENERGETYCZNA - OŚMIETLENIE = 3251,0 m
- SIEĆ ENERGETYCZNA - LATARNIE = 106 szt.
- SIEĆ TELETECHNICZNA:
- Koloracja T-9/Orange - K2TKMpw 15x4x0,8/SUZSR04E/04-06a = 55,0 m
- Koloracja T-11/1-Mobile/Siec miejska - 4xRHDPPE 40/3,7mm = 59,7 m; studnie - 1 szt.
- Koloracja T-12/SSPW - 4xRHDPPE 40/3,7mm = 348,1
- Koloracja T-13/Orange - K2TKMpw 15x4x0,8/SUZSR04E/04-06 = 221,5 m; studnie - 4 szt.
- Koloracja T-14/1-Mobile/Siec miejska - 4xRHDPPE 40/3,7 mm = 131,0; studnie - 1 szt.
- Koloracja T-15/HAWK/PCSS - 5xRHDPPE 40/3,7mm = 165,7 m; studnie - 1 szt.
- Kanał technologiczny = 2521,4 m; studnie - 48 szt.

**PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653 NA TERENIE MIASTA SUWALKI - III ETAP**  
 (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem tunelem pod torami)  
**Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami - roboty drogowe z niezbędną infrastrukturą.**



Rodzaj pracy:	inwentaryzacja Sieci teletechnicznej oraz sieci Energetycznej	Obiekt:	DW 653	Wykon.	ANGEQ USŁUGI GEODEZYJNE
Wykonano:	23/05/2020	Data:	21.05.2020	Wykon.	Beczek Andrzej
Sprawił:	Wróblewski Kamil	Układ:	wysok: Kronsztad 60	Wykon.	08-500 Ryki ul Wilosa 5/22
				Wykon.	NIP 826-131-73-55
				Wykon.	Reg 431263332
					Szkiec Nr 1/1
